

	ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) PERDAVIMAS PROCESO STANDARTAS	PS-PP2.09.01
		Puslapis 1 iš 5
		Leidimas 1

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) PERDAVIMAS
PROCESO STANDARTAS**

Taikoma: Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupė ir Projektų valdymo grupė	Atsakingas už įgyvendinimą: Infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Saulius Balčiūnas
Parengė: Infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Saulius Balčiūnas	Patvirtino: Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės vadovas Martynas Gedaminskas
Suderino: Veiklos efektyvumo valdymo komandos procesų valdymo projektų vadovas Aleksandr Vybornyj Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošius Projektų valdymo grupės vadovas Gediminas Katinas	Funkcija: PP2 Infrastruktūros valdymas

	ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) PERDAVIMAS PROCESO STANDARTAS	PS-PP2.09.01
		Puslapis 2 iš 5
		Leidimas 1

1. PASKIRTIS

Reglamentuoti atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūras, siekiant įvertinti, ar rangovo atlikti statybos darbai atitinka nustatytus reikalavimus

2. PAGRINDINĖ PROCESO INFORMACIJA

Proceso klientas (-ai)	Bendrovės darbuotojai; statybos dalyviai, išvardinti LR Statybos įstatymo 13 str.; objekto pridavime dalyvaujantys asmenys; visuomenė; LR Susisiekimo ministerija; LR Vyriausybė; LR Seimas; Kitos suinteresuotos įstaigos
Procese naudojamos IT priemonės	El. paštas, DVS, Infostatyba
Procesą sudarantys subprocesai	SPS-PP2.09.01.01 Galutinės objekto apžiūros subprocesas SPS-PP2.09.01.02 Komisijos sudarymo subprocesas SPS-PP2.09.01.03 Atliktų statybos darbų perdavimo subprocesas SPS-PP2.09.01.04 Deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pildymo subprocesas
Susiję procesai	SPS-PP2.05.01.04 Defektų pašalinimo fiksavimo subprocesas SPS-PP2.05.01.05 Kelio statinių ir jų elementų tyrimų vykdymo paskutiniais objekto garantiniais metais subprocesas SPS-PP2.05.01.06 Kasmetinės statinio stebėsenos ir defektų nustatymo subprocesas PS-PP2.05.01 Kelių priežiūros vykdymo procesas

2. SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI


2.1. Procese naudojamos sąvokos, sutrumpinimai, apibrėžimai:

Sąvoka, sutrumpinimas	Apibrėžimas
Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūra	Tai procedūra, kurios metu rangovas perduoda, o statytojas (užsakovas) įvertina pagal rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, priima atliktus statybos darbus ir pasirašo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą arba nepriimtų statybos darbų aktą
BAK	AB „Via Lietuva“ Korporatyvinių reikalų grupės biuro administravimo komanda
DVS	Bendrovės dokumentų valdymo sistema
DWG lyginamasis	Techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su akcine bendrove „Via Lietuva“ suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) DWG formatu su rangovo faktiškai atliktais statybos darbais, pažymėtais (užfiksuotais) išpildomojoje dokumentacijoje, t. y. parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje (DWG lyginamasis)
Esminis trūkumas (defektas)	Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ir (ar) paslaugos neatitikimas rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, esminiems statinių reikalavimams, arba kelia grėsmę asmenų ar turto saugumui

	ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) PERDAVIMAS PROCESO STANDARTAS	PS-PP2.09.01
		Puslapis 3 iš 5
		Leidimas 1

Galutinė projekto laida	Tai projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) laida, po atliktų statybos darbų pateikta projekto vykdymo priežiūros vadovo, įvertinus visus projektinių sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus
Bendrovė	Akcinė bendrovė „Via Lietuva“
Infostatyba	Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema
Neesminis trūkumas	Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ar paslaugos trūkumas, kuris neatitinka esminio trūkumo (defekto) sąvokos, ir kurį rangovas įsipareigoja pašalinti per atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akte nurodytą terminą. Neesminių trūkumų pašalinimo terminas parenkamas pagal meteorologines sąlygas, technologinių procesų pobūdį ir medžiagų reikalingų atlikti darbams tiekimo terminus, bet šis terminas negali viršyti 6 mėnesių laikotarpio
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai	Vidiniai: Visi dokumentai, kurie yra paskelbti Via Lietuva internetinės svetainės skiltyje „Normatyviniai dokumentai“: https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai Išoriniai: LR Civilinis kodeksas; LR Statybos įstatymas; LR Kelių įstatymas; Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (LRV 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 212 redakcija); Statybos techniniai reglamentai, kurių aktualios redakcijos pateikiamos www.e-tar.lt internetinėje svetainėje; Lietuvos Respublikos standartai (LST); Europos standartai (EN); Tarptautiniai standartai (ISO)
Objektas	Tai nutiestas (pastatytas), rekonstruotas, sutaisytas (suremontuotas) valstybinės reikšmės kelias, ar kelio ruožas, ar kelio elementas, nurodytas rangos pirkimo sutartyje
Piketas arba PK	Laikinas geodezinis ženklas – kuoliuku pažymėtas trasos taškas
Projektas	Tai dokumentų visuma, kuriame pateikti techninės srities, inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendiniai
Rangos pirkimo sutartis	Tai sutartis, kurios samprata pateikta LR Civilinio kodekso 6.681 straipsnio I dalyje
SLD	Statybą leidžiantis dokumentas
Statybos proceso dalyviai	Tai rangovas, statybos darbų techninis priežiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statytojas (užsakovas), dalyvaujantys atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūroje
Statinio statybos vadovas	Rangovo vidaus teisės aktu paskirtas kvalifikuotas specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę
Statytojas	Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, atliekanti statytojo funkciją
Užsakovas	Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ arba fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis pagal bendradarbiavimo sutartį su Bendrove, atliekantys užsakovo funkciją
TS	Techninė specifikacija

3. PROCESO SCHEMA

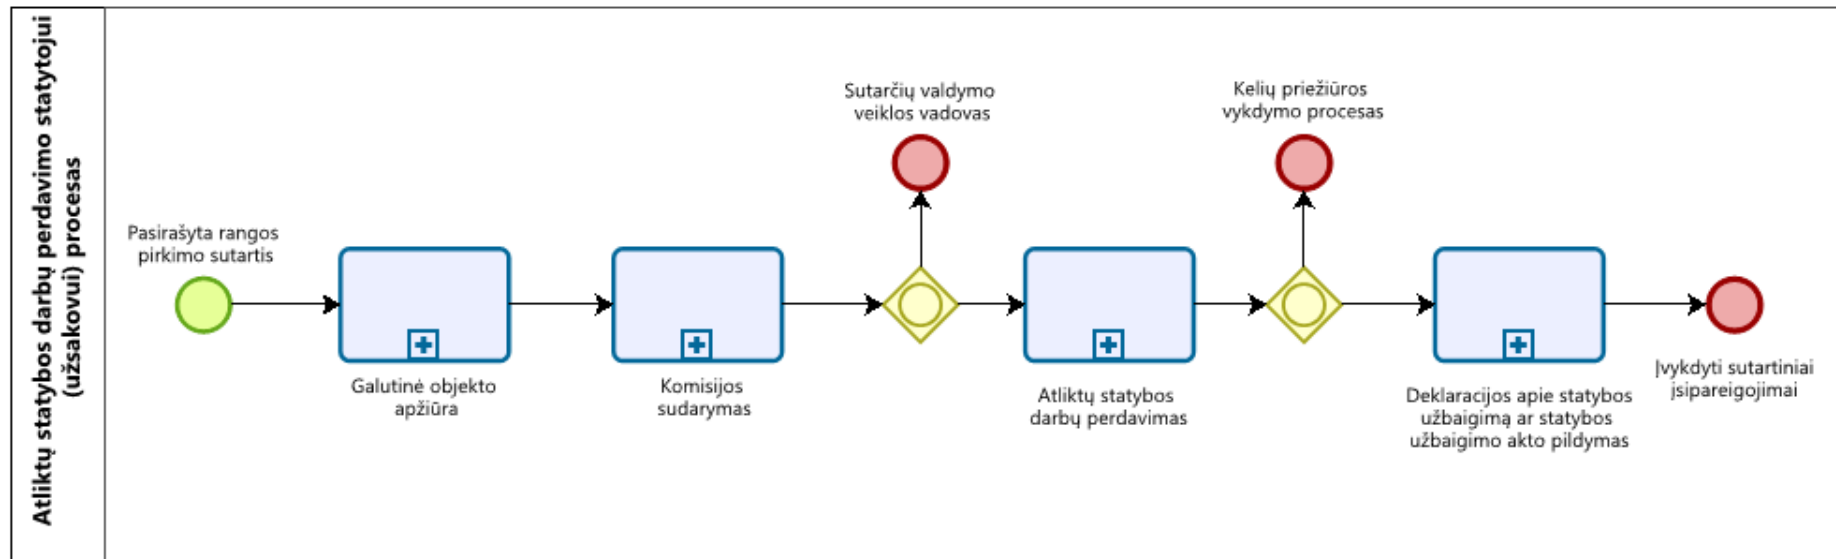

4. PROCESO SCHEMOS APRAŠYMAS

Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Atsakingi asmenys	Naudojamos priemonės	Susiję procesai	Atlikimo laikas / trukmė
1. SPS-PP2.09.01.01 Galutinė objekto apžiūra	Vykdomi subprocese aprašyti veiksmai	Rangovas, statybos darbų techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, kelių statybos priežiūros vadovas.	El. paštas ir proceso priedai		9 d.d.
2. SPS-PP2.09.01.02 Komisijos sudarymas	Vykdomi subprocese aprašyti veiksmai	Rangovas, statybos darbų techninis prižiūrėtojas, projektų koordinatorius, projekto įgyvendinimo komandos nariai.	El. paštas, DVS ir proceso priedai		19 d.d.
3. SPS-PP2.09.01.03 Atliktų statybos darbų perdavimas	Vykdomi subprocese aprašyti veiksmai	Rangovas, statybos darbų techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, kelių statybos priežiūros vadovas, Komisijos pirmininkas ir nariai, bei kiti komisijos dalyviai.	El. paštas, DVS ir proceso priedai		15 d.d.
4. SPS-PP2.09.01.04 Deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pildymas	Vykdomi subprocese aprašyti veiksmai	Rangovas, projektų koordinatorius, įgaliojimo derintojai, Infostatybos administratorius, kelių statybos priežiūros vadovai,	El. paštas, DVS ir Infostatyba		Per rangos sutartyje nustatytą terminą.
